


# 工事中の配置計画について（案）


**STEP. 1** R2年4月～R2年12月（約9か月）



**STEP. 2** R3年1月～R5年12月（約3年）

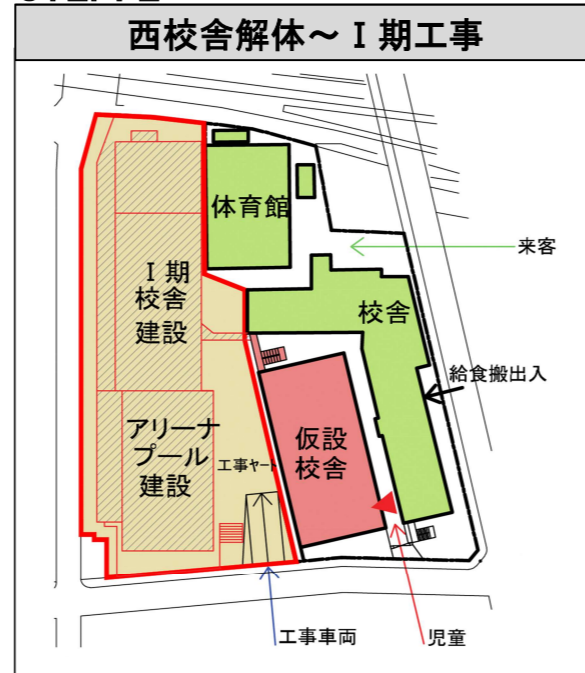

**STEP. 3** R6年1月～R6年3月（約3か月）

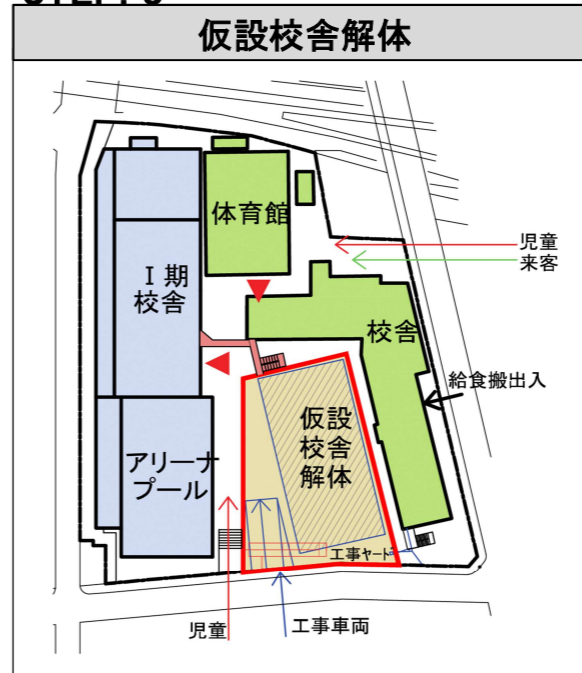

**STEP. 4** R6年4月～R8年8月（約2年5か月）



**STEP. 5** R8年9月～R9年3月（約7か月）



**STEP. 6** R9年4月～



**【凡例】**

- 青 新築建物
- 赤 仮設建物
- 緑 既存建物
- ◀ 校舎入口
- 工事ヤード

工程	2019年度(R元年度)				2020年度(R2年度)				2021年度(R3年度)				2022年度(R4年度)				2023年度(R5年度)				2024年度(R6年度)				2025年度(R7年度)				2026年度(R8年度)				2027年度(R9年度)			
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月				
実施設計	実施設計				STEP. 1				STEP. 2				STEP. 3				STEP. 4				STEP. 5				STEP. 6											
準備工事	準備工事				仮設校舎建設				I 期工事(校舎一部、アリーナ、プール)				仮設校舎取壊し				II 期工事(校舎一部、給食室)				東側校舎取壊し				外構校庭整備											
擁壁工事・西側校舎取壊し																																				
仮設校舎及び既存校舎併用利用期																																				
I 期新築部分及び既存校舎併用利用																																				
I 期新築及びII 期新築建物利用																																				

※建物の配置・スケジュールについては、今後の詳細な検討により変更する可能性があります。
